
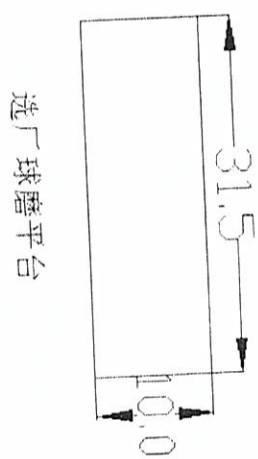
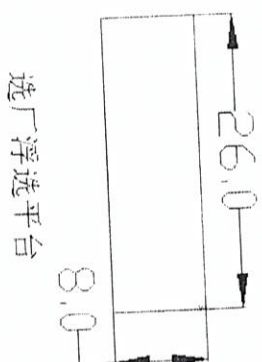


办公楼铺装沥青面示意图

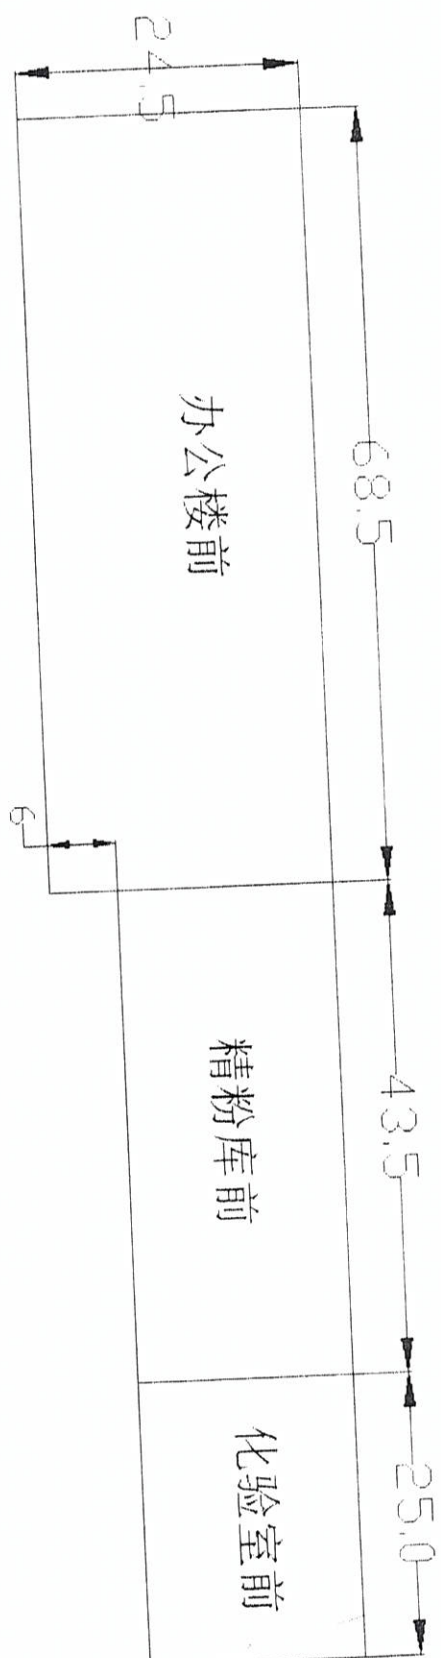

面积共计 3468 m²

(单位: 米)

张泽新

安泰公司办公楼前沥青路面

1. 清扫干净基层，检查基层宽度、路拱、标高、平整度及弯沉值等，检验符合设计、规范要求后方可进行沥青砼面层施工，并按规定喷洒透层或粘层油。

2. 沥青面铺设厚度为 60mm。

3. 压实要严格控制碾压温度、速度和遍数，保证达到要求的密实度。须初压、复压和终压三道工序。

(1) 初压

双轮压路机压两遍，初压后检查平整度、路拱，并随时修整，如碾压时出现推移，可待温度稍低后再压。

(2) 复压

复压必须与初压紧密衔接，重型压路机碾压 4~6 遍，直至稳定和无明显轮迹。

(3) 终压

终压最后形成平整的压实面。采用压路机碾压 2~4 遍。

4. 工程面积见附图，并最终与实际发生面积为准。

